

COMUNE DI
FIRENZE



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL TPL
codice opera 150252**

TITOLARE e R.U.P.

Ing. Giuseppe Carone

PROGETTISTI

*Arch. Riccardo Roda
Arch. Silvio Pappalettere
(RES Architetture)*

COLLABORATORE

Ing. Simone Mannucci


C.S.P.

*Arch. Riccardo Roda
(RES Architetture)*


PROGETTO ESECUTIVO

progetto		fase		ambito/opera		disciplina		tipo/numero elaborato		rev.	scala		<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">n. progressivo</td> </tr> </table>		3	0	n. progressivo	
3	0																	
n. progressivo																		

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	15/06/2018	PSC - Cronoprogramma			



INT. 1 - VIA V. VENETO

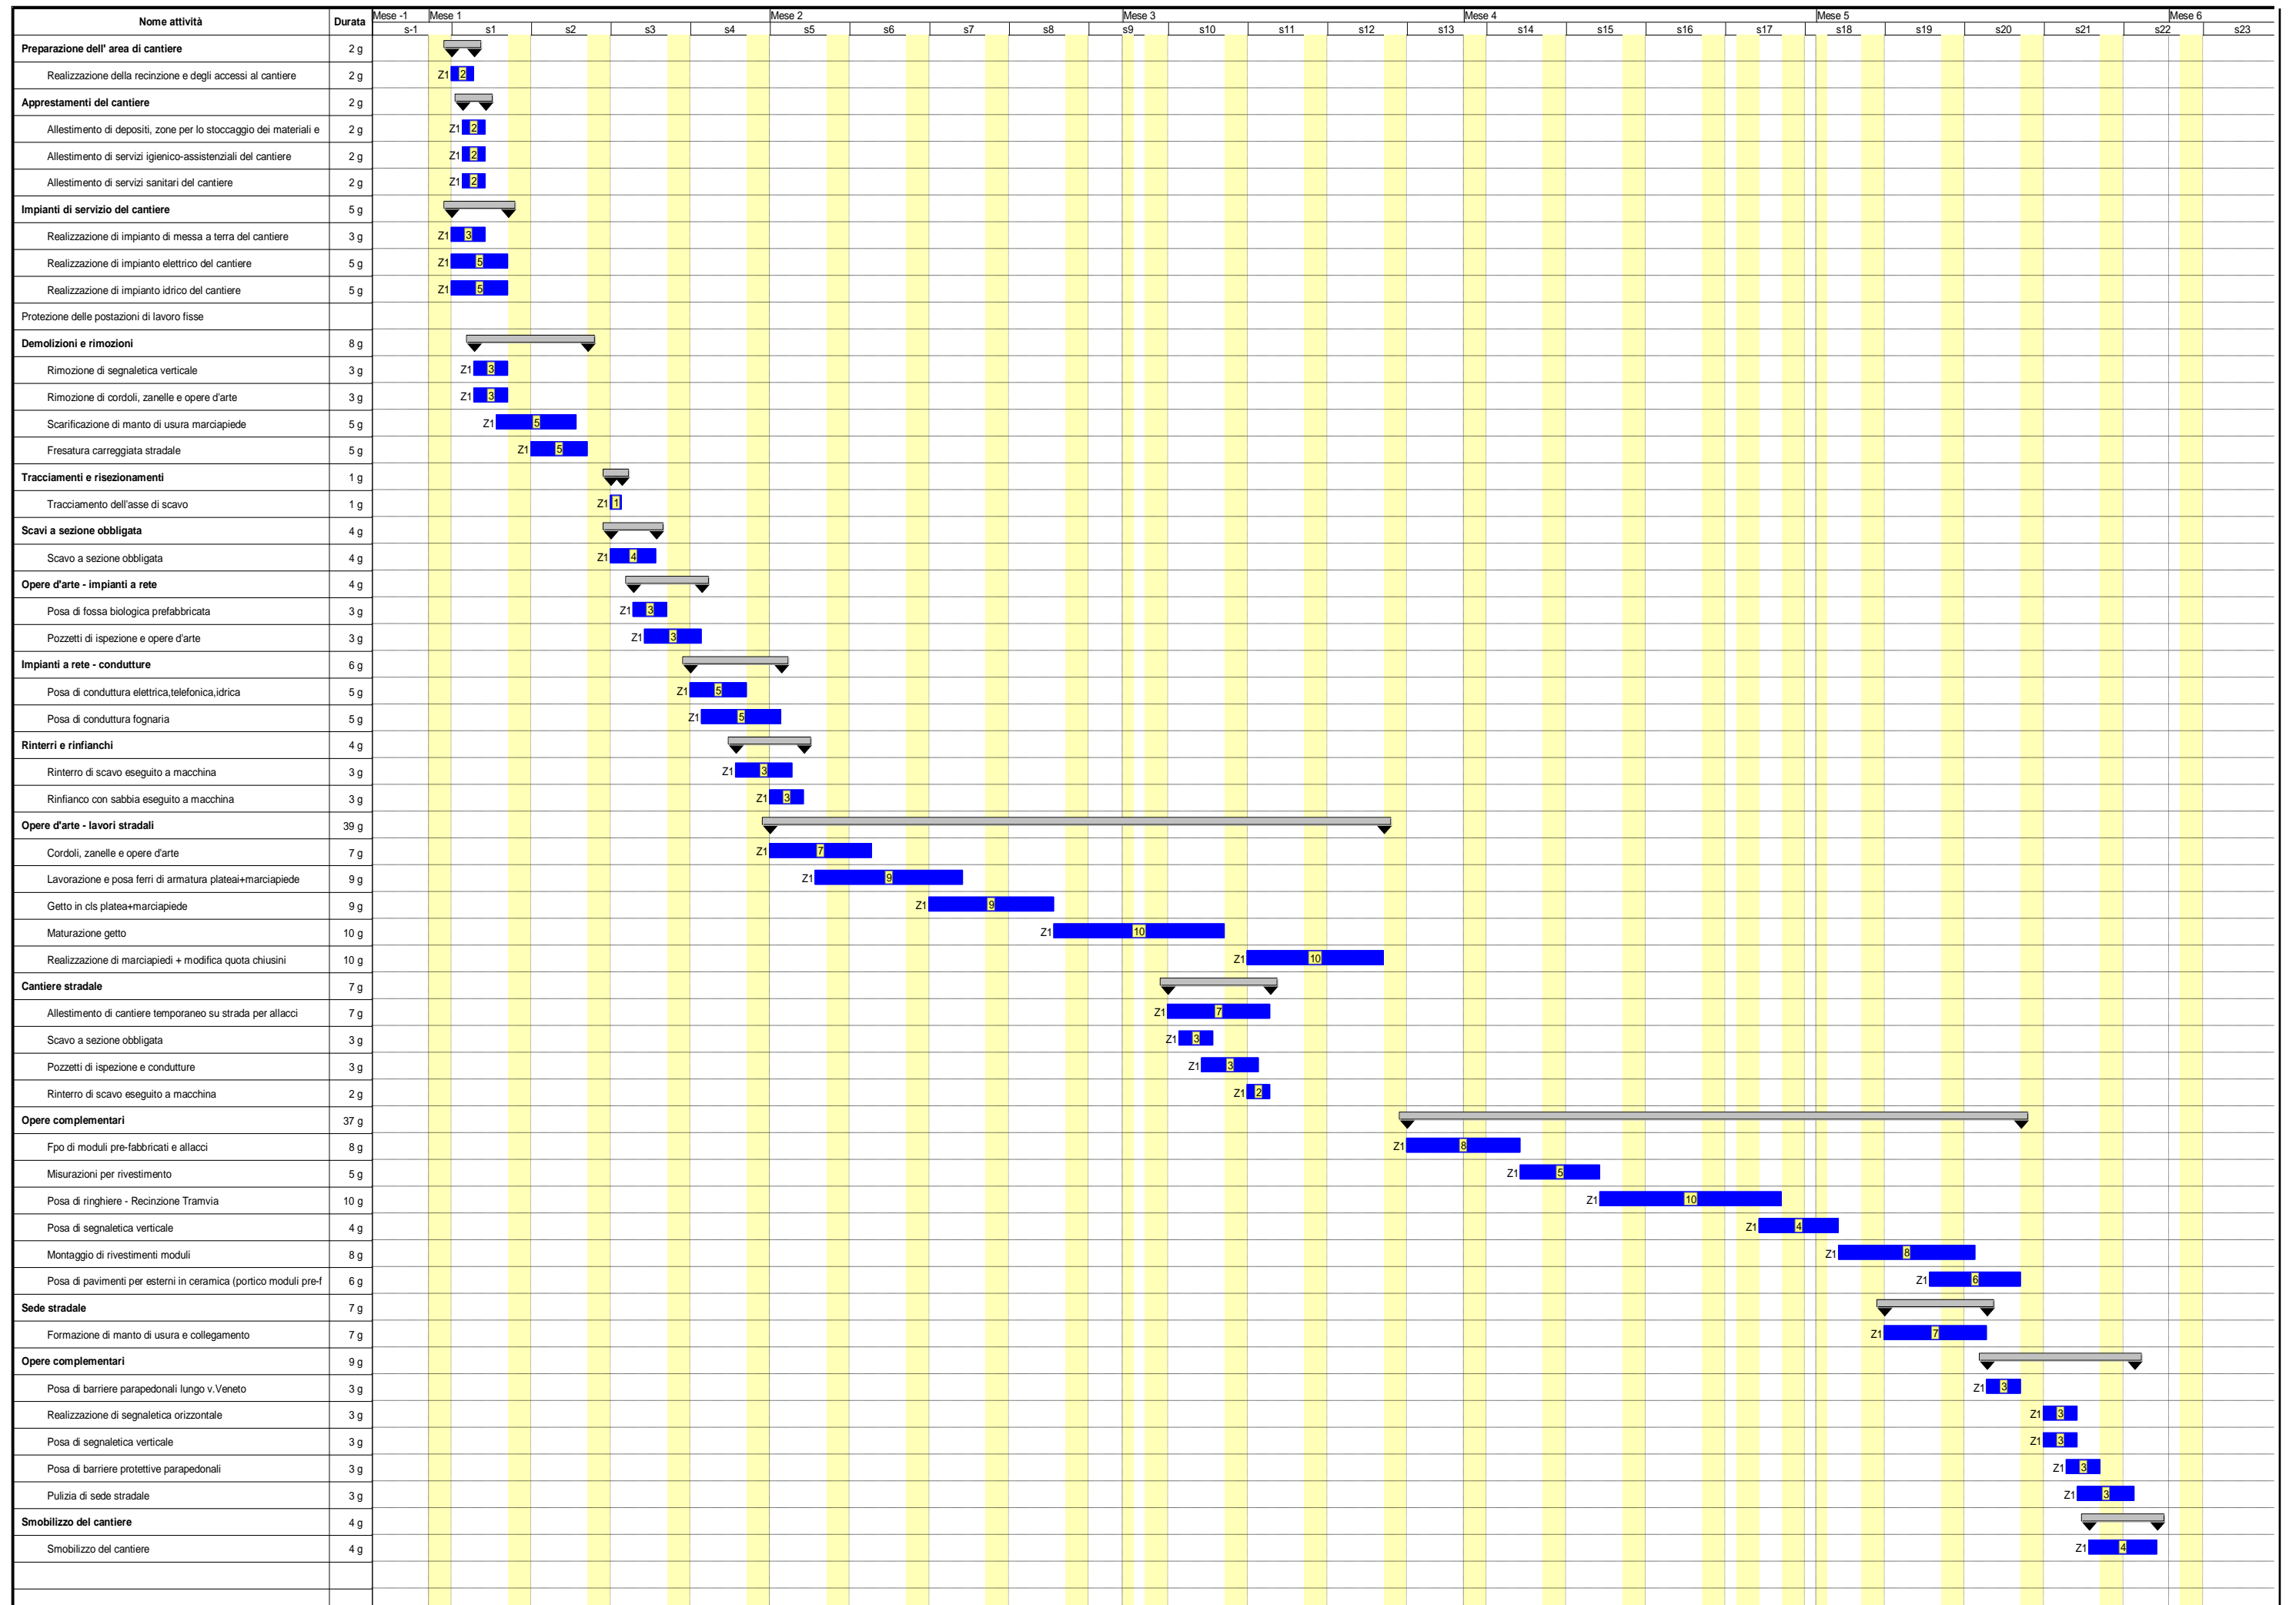

INT. 2 – P.LE MONTELUONGO

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19
FASE 1 Preparazione dell'area di cantiere - Z4	2 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1 2																			
FASE 1 Preparazione dell'area di cantiere - Z1	2 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1 2																			
FASE 1 Impianti di servizio del cantiere - Z4	2 g																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	Z1 2																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z1 2																			
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g	Z1 2																			
FASE 1 Apprestamenti del cantiere - Z4	3 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	3 g	Z1 3																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g	Z1 3																			
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g	Z1 3																			
FASE 1 Demolizioni e rimozioni - Z1	2 g																				
Scarificazione di manto d'usura area pedonale	2 g	Z1 2																			
FASE 1 Sede stradale - Z1	2 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g	Z1 2																			
FASE 1 Smobilizzo del cantiere - Z1	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1 1																			
FASE 2 Preparazione delle aree di cantiere - Z2	2 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z2 2																			
FASE 2 Tracciamenti e risezionamenti - Z2	3 g																				
Tracciamento dell'asse di scavo	3 g	Z2 3																			
FASE 2 Demolizioni e rimozioni - Z2	2 g																				
Rimozione di barriere parapetonali	2 g	Z2 2																			
Rimozione di segnaletica verticale	2 g	Z2 2																			
Rimozione di segnaletica orizzontale	1 g	Z2 1																			
FASE 2 Scavi a sezione obbligata - Z2	5 g																				
Scavo a sezione obbligata	5 g	Z2 5																			
FASE 2 Opere d'arte - impianti a rete - Z2	3 g																				
Posa di fossa biologica prefabbricata	2 g	Z2 2																			
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g	Z2 3																			
FASE 2 Impianti a rete - condutture - Z2	5 g																				
Posa di conduttura elettrica, telefonica, idrica	5 g	Z2 5																			
Posa di conduttura fognaria	5 g	Z2 5																			
FASE 2 Rinterri e rinfianchi - Z2	3 g																				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g	Z2 3																			
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	3 g	Z2 3																			
FASE 2 Demolizioni e rimozioni - Z2	2 g																				
Scarificazione di manto d'usura area pedonale	2 g	Z2 2																			
FASE 2 Strutture Platea moduli - Plinti pensilina - Z2	12 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioi	2 g	Z2 2																			
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g	Z2 1																			
Maturazione getto	9 g	Z2 9																			
FASE 2 Sede stradale - area pedonale - Z2	4 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g	Z2 4																			
FASE 2 Smobilizzo del cantiere - Z2	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z2 1																			
FASE 3 Delimitazione dell'area di cantiere - Z3	1 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z3 1																			
FASE 3 Opere complementari - Z3	17 g																				
Fpo di moduli pre-fabbricati e allacci	6 g	Z3 6																			
Misurazioni per rivestimento	6 g	Z3 6																			
Fpo di pensilina in acciaio e vetro	7 g	Z3 7																			
FASE 3 Opere complementari - Segnaletica e Rivestimenti- Z3	17 g																				
Posa di segnaletica verticale	4 g	Z3 4																			
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g	Z3 4																			
Montaggio rivestimenti moduli	9 g	Z3 9																			
Pulizia di sede stradale	2 g	Z3 2																			
FASE 3 Smobilizzo del cantiere - Z3	2 g																				
Smobilizzo del cantiere	2 g	Z3 2																			
FASE 4 Preparazione dell'area di cantiere - Z4	2 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z4 2																			
FASE 4 Spostamento apprestamenti del cantiere - Z4	2 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p	2 g	Z4 2																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z4 2																			
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g	Z4 2																			
FASE 4 Demolizioni e rimozioni - Z4	3 g																				
Scarificazione di manto d'usura area pedonale	2 g	Z4 2																			
Scarificazione di manto d'usura marciapiede	3 g	Z4 3																			
FASE 4 Sede stradale - area pedonale - Z4	7 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g	Z4 7																			
FASE 4 Opere d'arte - Marciapiede - Z4	13 g																				
Sistemazione cordoli	10 g	Z4 10																			
Realizzazione di marciapiede	10 g	Z4 10																			
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3 g	Z4 3																			
FASE 4 Smobilizzo del cantiere - Z4	4 g																				
Smobilizzo del cantiere	3 g	Z4 3																			
Pulizia di sede stradale	1 g	Z4 1																			

