N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA
1	Allestimento cantiere	
2	Allestimento recinzioni ed apposizione cartellonistica	1
3	Rimozione cordolo perimetrale accesso cantiere	1
4	Rimozione di vegetazione esistente e formazione di strato stabilizzante in ghiaia	3
5	Trasporto, scarico ed installazione box prefabbricati e bagni chimici	1
6	Intervento su membrana impermeabile per passaggi impianti di cantiere e di progetto	2
7	Impianto di cantiere, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche	
8	Impianto elettrico e di terra del cantiere	1
9	Allacciamento apprestamenti ed impianti	1
10	Rimozione palo di illuminazione pubblica	
11	Rimozione palo illuminazione ed accatastamento in cantiere	1
12	Demolizioni pavimentazioni e fondo stradale	
13	Rimozioni pavimentazioni in autobloccante e cordoli	1
14	Rimozione fondo stradale per platea e plinti di fondazione	4
15	Scavi e movimenti di terreno sciolto per platee, plinti, impianti e reinterro	
16	Formazione di scavo su terreno sciolto per platee e magrone area giochi	4
17	Formazione di sede nuovi pozzetti, griglie di raccolta e tracce per gli impianti	11
18	Impianti elettrici, speciali e illuminazione	
19	Posa in opera delle dorsali di impianti elettrici, speciali e illuminazione	11
20	Posa in opere delle linee, montaggio dei quadri elettrici	10
21	Posa in opera impianto trasmissione dati (rack e wifi)	7
22	Impianti meccanici	
23	Posa in opera di impianti smaltimento acque meteoriche, irrigazione e distribuzione acqua fredda	16
24	Opere in cemento armato e posa elementi prefabbricati	
25	Getto di calcestruzzo per formazione magrone	1
26	Formazione di casseratura e posa dei ferri vani tecnici impianti	2
27	Formazione di platee su aree giochi	5
28	Formazione di platea e plinti armati di fondazione area parcheggio	5
29	Getto di calcestruzzo	2
30	Formazione di casseratura e posa di ferri delle vasche di contenimento area giochi	15
31	Getto di calcestruzzo per platee e vasche di contenimento	2
32	Posa di elementi prefabbricati per impianti (pozzetti e plinti)	3
33	Disarmo delle casserature	2
34	Impianto di illuminazione	
35	Posa in opera dei pali di illuminazione interni all'area attrezzata e corpi luminosi	1
36	Posa in opera dei pali di illuminazione esterni all'area attrezzata e corpi luminosi	1
37	Opere a verde su vasche di contenimento	
38	Formazione degli strati impermeabilizzanti e drenanti delle vasche	5
39	Piantumazione essenze arboree su vasche di contenimento, percorso pedonale	3
40	Pavimentazione e rivestimenti	
41	Posa in opera di bordatura metallica di contenimento, stesura e compattazione asfalto su aree gioco e percorsi, imprimitura di disegno e resinatura finale	10
42	Posa in opera di asfaltatura e compattazione su parcheggio esistente	2
43	Posa in opera di rivestimenti aree e percorso gioco in pietra serena, gomma, e wbc	9
44	Posa in opera di cordoli di delimitazione, preparazione sottofondo e posa in opera di pavimentazione in autobloccanti	13
45	Opere di finitura elementi in cemento armato	
46	Rasatura e verniciatura vasche di contenimento e gradonature	15
47	Attrezzature gioco ed arredo urbano	
48	Posa in opera di sedute monolitiche in cemento	1
49	Posa in opera di attrezzature gioco	5
50	Posa in opera di arredi urbani (fontane, sedute, totem) e recinzioni metalliche	5
51	Strutture metalliche area gioco e parcheggio	
52	Posa in opera pensilina metallica su percorso gioco	1
53	Posa in opera di pensilina di acciaio e fissaggio del basamento su plinti armati	1
54	Impianto fotovoltaico	
55	Posa in opera di impianto fotovoltaico e collegamenti con inverter	2
56	Opere a verde finali	
57	Installazione orti didattici e rampicanti	2
58	Posa in opera di bordature metalliche di contenimento, formazione degli strati e piantumazione aiuole	3
59	Posa in opera di bordature metalliche di contenimento e formazioni aree in terra battuta	3
60	Ripristino manto erboso	6
61	Smobilizzo cantiere	
62	Rimozione impianti di cantiere, quadri elettrici ed allacciamenti baracche ed impianti	1
63	Rimozione box prefabbricati e bagni chimici	1
64	Rimozione strato stabilizzante di cantiere	6
65	Rimozione cartellonistica, recinzioni e ripristino cordolo perimetrale	1

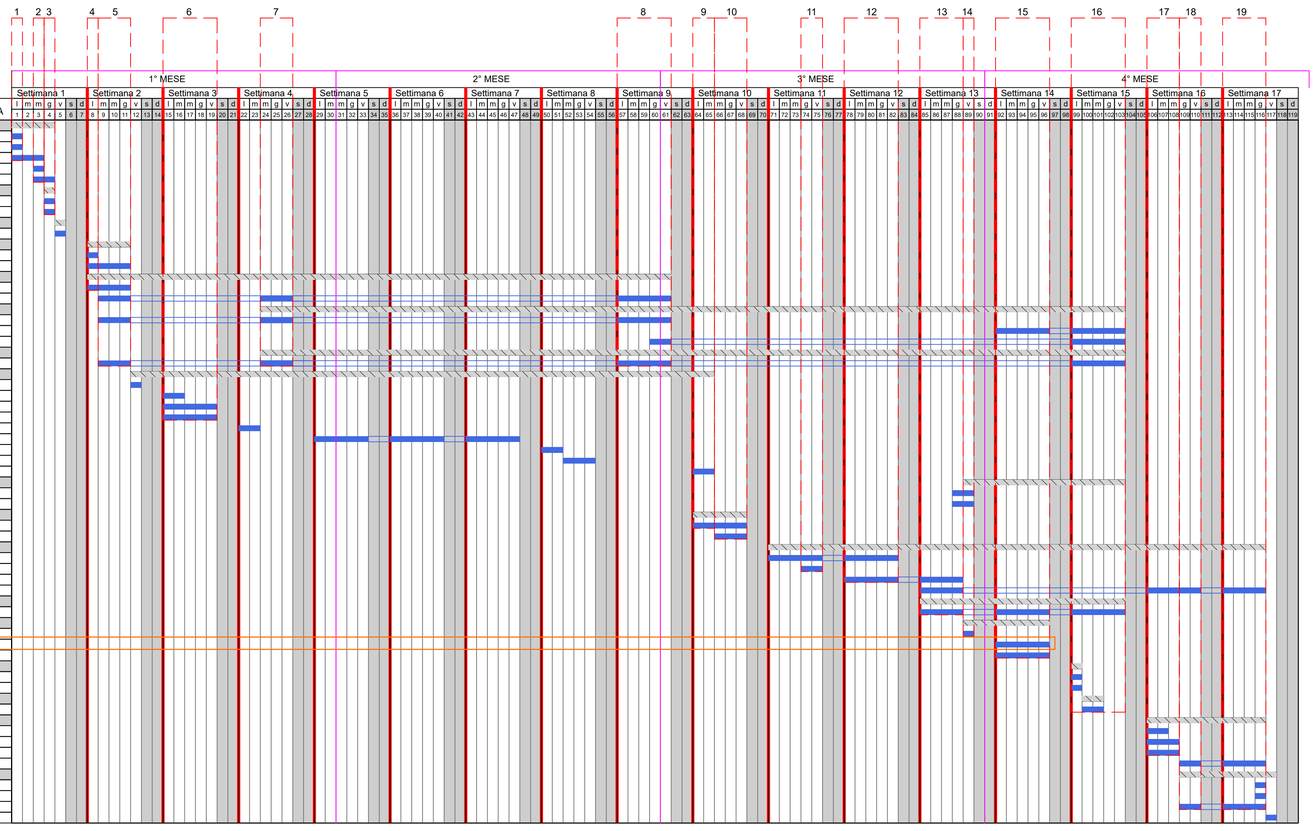

PE
Progetto Esecutivo

CIG: ZDD3DDA5F1
CUP: H15I22000420001

COMUNE DI FIRENZE

Comune di Firenze
Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

Villa di Rusciano - Via Benedetto Fortini 37
50125, Firenze (Italia)
t. 055 2625385 - f. 055 2625356
direz.ambiente@comune.fi.it

RUP:

ing. Raffaele Gualdani

CAPOGRUPPO MANDATARIO:

Progettazione architettonica
arch. Eugenio Salvetti
Via del Ghirlandaio 3r. 50121. Firenze (Italia)
t. 055 9064073
p.iva 01547970531
salvetti@oksarchitetti.com

MANDANTI:

Progettazione architettonica
arch. Luca Scollo

Progettazione architettonica
(giovane professionista abilitato)
arch. Maria Cristina Bartolucci

Progettazione impiantistica
CMA s.r.l.
per. ind. Alessio Diegoli
ing. Maurizio Mazzanti

Progettazione strutturale
ing. Andrea Pagliazzi

Coordinamento della Sicurezza
arch. Luigi Petrillo

Geologia
SINERGIA s.r.l.s.
dott. Luca Gardone

Realizzazione di area giochi nel quartiere Le Piagge - via dell'Osteria, nell'ambito del programma sperimentale "Dateci spazio"

stato:	revisione:	
CONSEGNA	REV 1	

titolo elaborato:
Cronoprogramma dei lavori

data:	scala:	codice elaborato:
mar. 2024		DG_08
